

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).  
 Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kolbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług.ok.15,151km.


Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

Inżynier MGGP S.A.  
 ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów  
 NIP: 734-24-80-395

Wykonawca Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków  
 Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław



PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

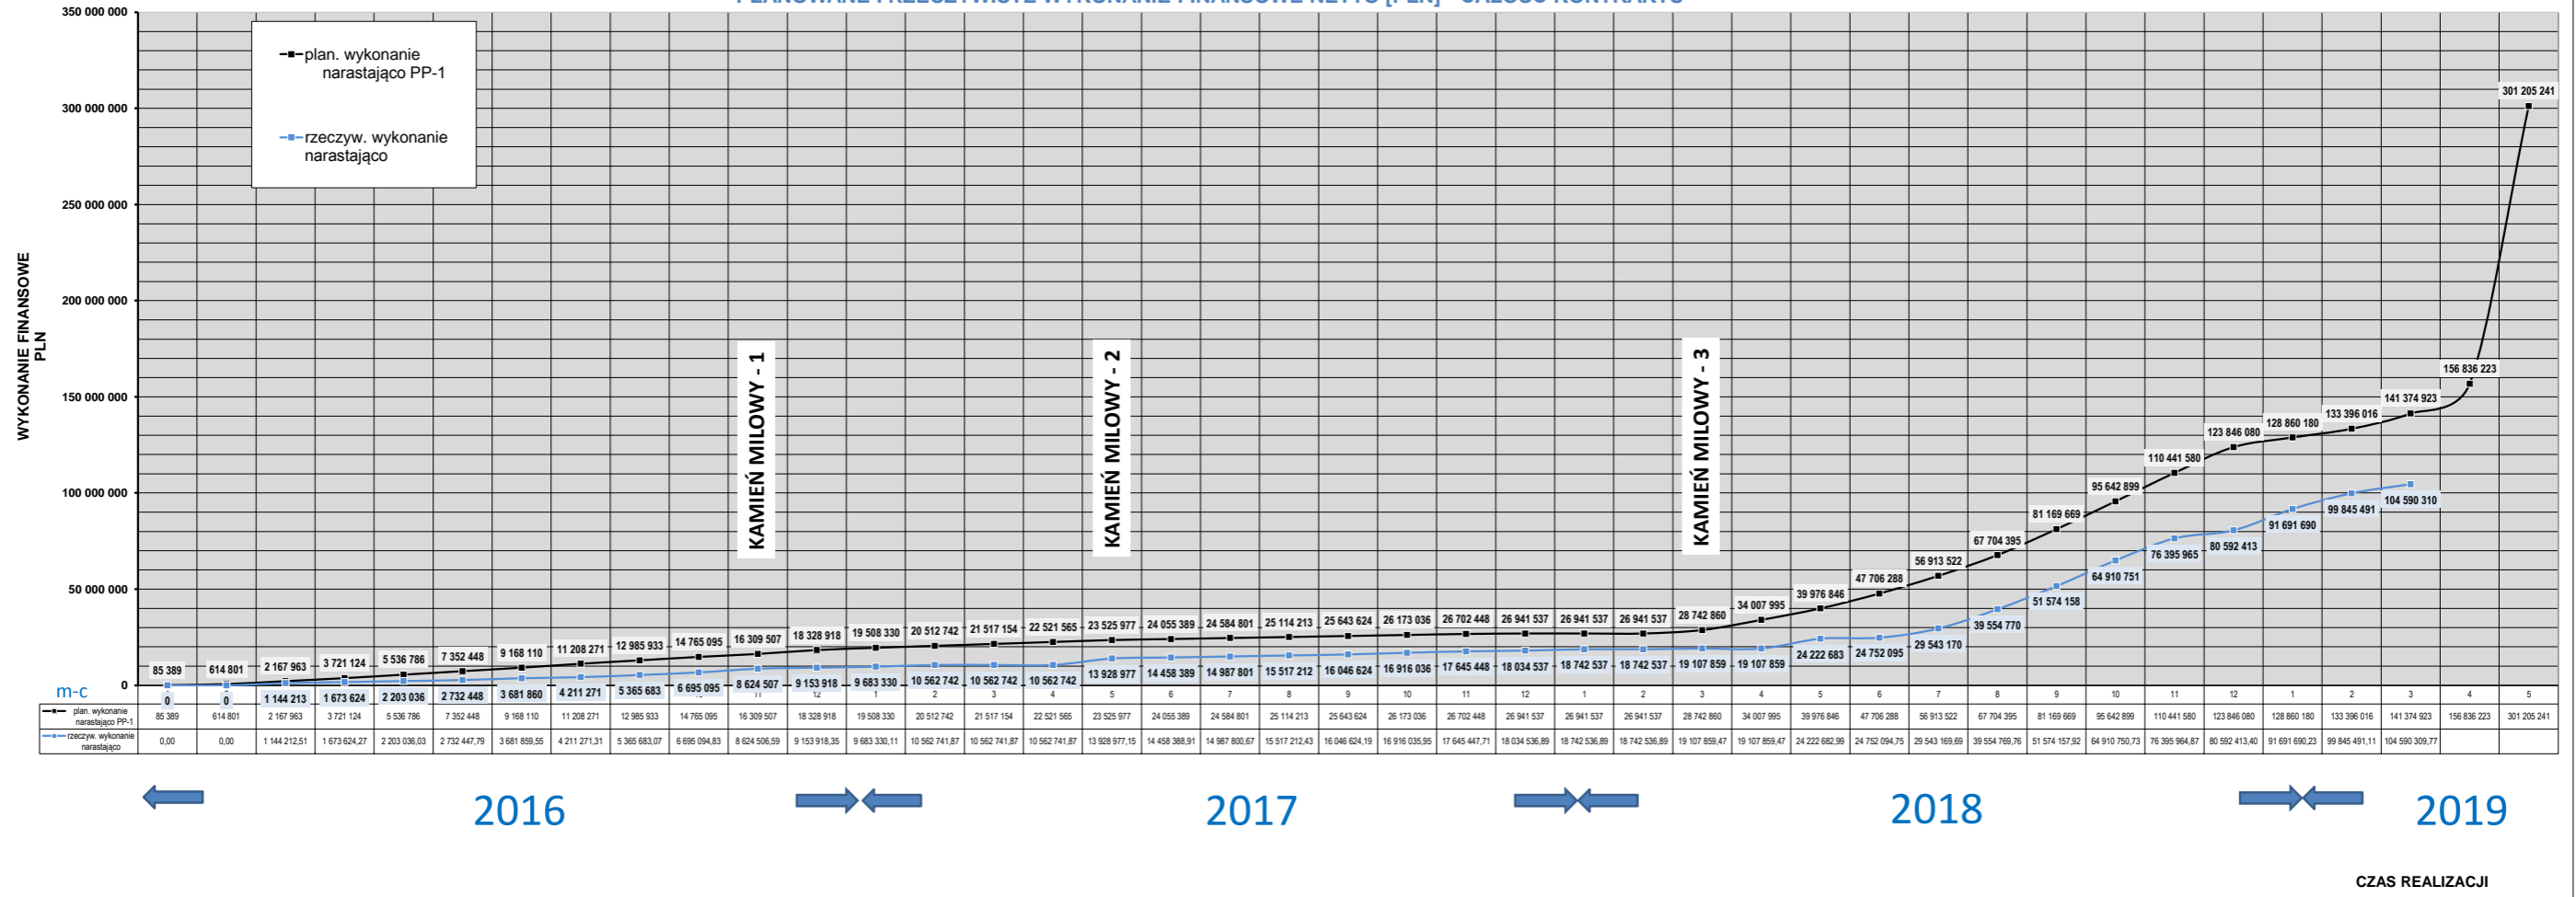

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
Wykonanie w m-cu	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	301 205 241		
Realizacja płatności	0,00	0,00	1 144 212,51	1 673 624,27	2 203 036,03	2 732 447,79	3 681 859,55	4 211 271,31	5 365 683,07	6 695 094,83	8 624 506,59	9 153 918,35	9 683 330,11	10 562 741,87	10 562 741,87	10 562 741,87	13 928 977,15	14 458 389,91	14 987 800,67	15 517 212,43	16 046 624,19	16 916 036,95	17 645 447,71	18 034 536,89	18 742 536,89	18 742 536,89	19 107 859,47	19 107 859,47	24 222 682,99	24 752 095,75	29 543 169,69	39 554 769,76	51 574 157,92	64 910 750,73	76 395 964,87	80 592 413,40	91 691 690,23	99 845 491,11	104 590 309,77				
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	301 205 241		
plan. wykonanie narastająco PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	301 205 241		
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 212,51	1 673 624,27	2 203 036,03	2 732 447,79	3 681 859,55	4 211 271,31	5 365 683,07	6 695 094,83	8 624 506,59	9 153 918,35	9 683 330,11	10 562 741,87	10 562 741,87	10 562 741,87	13 928 977,15	14 458 389,91	14 987 800,67	15 517 212,43	16 046 624,19	16 916 036,95	17 645 447,71	18 034 536,89	18 742 536,89	18 742 536,89	19 107 859,47	19 107 859,47	24 222 682,99	24 752 095,75	29 543 169,69	39 554 769,76	51 574 157,92	64 910 750,73	76 395 964,87	80 592 413,40	91 691 690,23	99 845 491,11	104 590 309,77				
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	1 144 212,51	1 673 624,27	2 203 036,03	2 732 447,79	3 681 859,55	4 211 271,31	5 365 683,07	6 695 094,83	8 624 506,59	9 153 918,35	9 683 330,11	10 562 741,87	10 562 741,87	10 562 741,87	13 928 977,15	14 458 389,91	14 987 800,67	15 517 212,43	16 046 624,19	16 916 036,95	17 645 447,71	18 034 536,89	18 742 536,89	18 742 536,89	19 107 859,47	19 107 859,47	24 222 682,99	24 752 095,75	29 543 169,69	39 554 769,76	51 574 157,92	64 910 750,73	76 395 964,87	80 592 413,40	91 691 690,23	99 845 491,11	104 590 309,77				
% zawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	0,91%	1,22%	1,40%	1,78%	2,22%	2,86%	3,04%	3,21%	3,51%	3,51%	3,51%	4,62%	4,80%	4,98%	5,15%	5,33%	5,62%	5,86%	5,99%	6,22%	6,22%	6,34%	6,34%	8,04%	8,22%	9,81%	13,13%	17,12%	21,55%	25,36%	26,76%	30,44%	33,15%	34,72%				
% wykonania harm. w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	73,67%	34,09%	29,16%	29,16%	52,29%	25,95%	64,94%	74,72%	124,93%	26,22%	44,89%	87,55%	0,00%	0,00%	335,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164,22%	137,78%	162,74%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
% wykonania harm. narastająco	0,00%	0,00%	52,78%	44,98%	39,79%	37,16%	40,16%	37,57%	41,32%	45,34%	52,88%	49,94%	49,64%	51,49%	49,09%	46,90%	59,21%	60,10%	60,96%	61,79%	62,58%	64,63%	66,08%	66,94%	69,57%	69,57%	66,48%	56,19%	60,59%	51,88%	51,91%	58,42%	63,54%	67,87%	69,17%	65,07%	71,16%	74,85%	73,98%				
	0,03%	0,20%	0,72%	1,24%	1,84%	2,44%	3,04%	3,72%	4,31%	4,90%	5,41%	6,09%	6,48%	6,81%	7,14%	7,48%	7,81%	7,99%	8,16%	8,34%	8,51%	8,69%	8,87%	8,94%	8,94%	9,54%	11,29%	13,27%	15,84%	18,90%	22,48%	26,95%	31,75%	36,67%	41,12%	42,78%	44,29%	46,94%	52,07%	100,00%			
