

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kolbień (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, długość ok. 15,151km.

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.


**ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN]
STAN NA DZIEŃ 30.09.2019 - WG WYDANYCH PŚP**

Inżynier MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
NIP: 734-24-80-395

Wykonawca Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław



PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

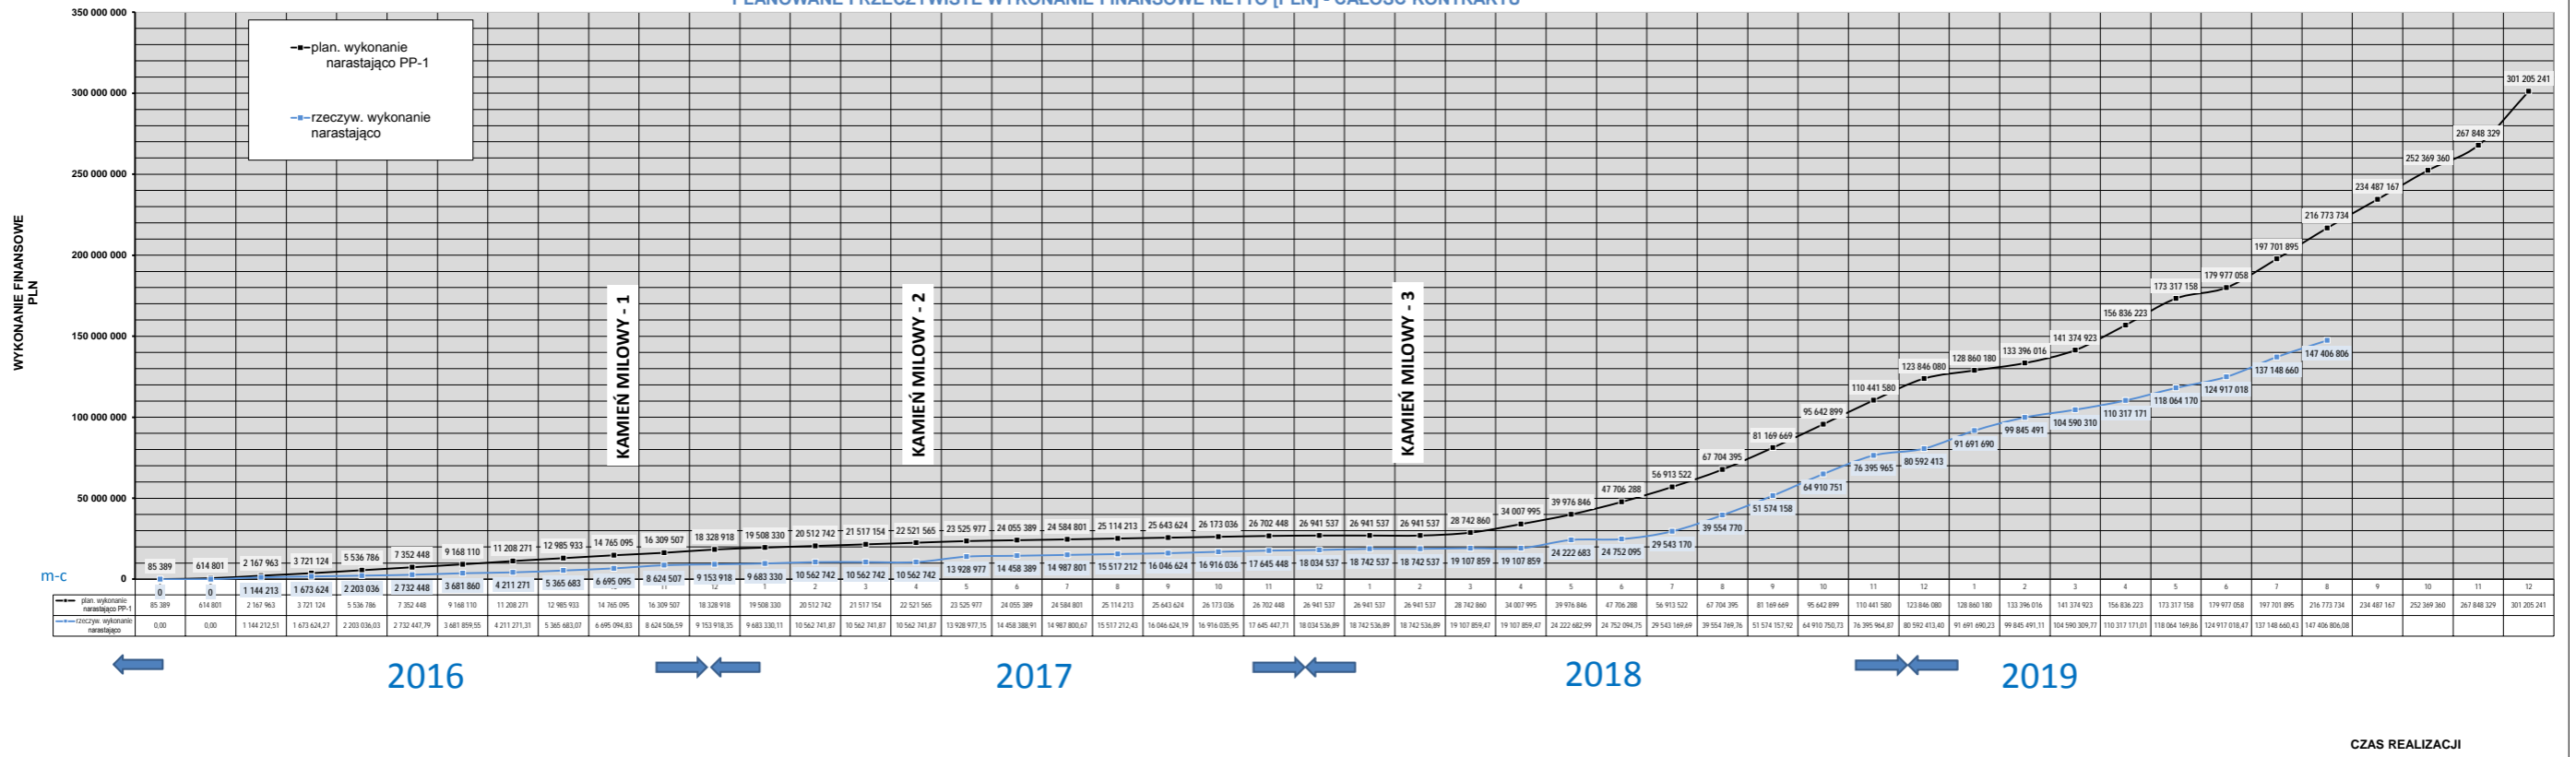

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wykonanie w m-cu Realizacja płatności	85 389	529 412	1 553 162	1 553 162	1 815 642	1 815 642	1 815 642	2 040 162	1 777 662	1 779 162	1 544 412	2 019 412	1 179 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	239 089	0	0	1 801 323	5 265 136	5 968 851	7 729 442	9 207 234	10 790 873	13 465 273	14 473 233	14 798 681	13 404 560	5 014 101	4 535 835	3 978 907	15 461 300	16 480 936	6 409 899	17 724 837	19 071 840	17 713 433	17 882 192	15 478 969	33 356 912
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	252 369 360	267 848 329	301 205 241
plan. wykonanie narastająco PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	252 369 360	267 848 329	301 205 241
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 213,1	1 673 624,2	2 203 036,3	2 732 447,9	3 681 899,55	4 211 271,31	5 365 683,07	6 695 095,83	8 624 507,11	9 153 918,35	9 683 330,11	10 562 742,87	10 562 742,87	10 562 742,87	13 928 977,15	14 458 389,91	14 987 801,67	15 517 212,43	16 046 624,19	16 916 036,95	17 645 447,71	18 034 537,89	18 742 537,89	19 107 859,47	19 107 859,47	24 222 682,99	24 752 095,99	29 543 169,69	39 554 770,76	51 574 157,92	64 910 750,73	76 395 964,87	80 592 413,80	91 691 690,23	99 845 491,11	104 590 310,77	110 317 171,01	118 064 170,84	124 917 018,47	137 148 660,43	147 406 806,08					
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	1 144 213,1	1 673 624,2	2 203 036,3	2 732 447,9	3 681 899,55	4 211 271,31	5 365 683,07	6 695 095,83	8 624 507,11	9 153 918,35	9 683 330,11	10 562 742,87	10 562 742,87	10 562 742,87	13 928 977,15	14 458 389,91	14 987 801,67	15 517 212,43	16 046 624,19	16 916 036,95	17 645 447,71	18 034 537,89	18 742 537,89	19 107 859,47	19 107 859,47	24 222 682,99	24 752 095,99	29 543 169,69	39 554 770,76	51 574 157,92	64 910 750,73	76 395 964,87	80 592 413,80	91 691 690,23	99 845 491,11	104 590 310,77	110 317 171,01	118 064 170,84	124 917 018,47	137 148 660,43	147 406 806,08					
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	0,91%	1,22%	1,40%	1,78%	2,22%	2,86%	3,04%	3,21%	3,51%	3,51%	4,62%	4,80%	4,98%	5,15%	5,33%	5,62%	5,86%	5,99%	6,22%	6,22%	6,22%	6,34%	6,34%	8,04%	8,22%	9,81%	13,13%	17,12%	21,55%	25,36%	26,76%	30,44%	33,15%	34,72%	36,63%	39,20%	41,47%	45,53%	48,94%				
% wykonania ham. w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	73,67%	34,09%	29,16%	29,16%	52,29%	25,95%	64,94%	74,72%	124,93%	26,22%	44,89%	87,55%	0,00%	0,00%	335,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164,22%	137,78%	162,74%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
% wykonania ham. narastająco	0,00%	0,00%	52,78%	44,98%	39,79%	37,16%	40,16%	37,57%	41,32%	45,34%	52,88%	49,94%	49,64%	51,49%	49,09%	46,90%	59,21%	60,10%	60,96%	61,79%	62,58%	64,63%	66,08%	66,94%	69,57%	69,57%	66,48%	56,19%	60,59%	51,88%	51,91%	58,42%	63,54%	67,87%	69,17%	65,07%	71,16%	74,85%	73,98%	70,34%	68,12%	69,41%	69,37%	68,00%				
