

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
 Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Koltiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, długość ok. 15,151km.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU [%]
STAN NA DZIEŃ 31.08.2019


Inżynier MGGP S.A.
 ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tamów
 NIP: 734-24-80-395



Wykonawca Lider: Strabag Sp.z o.o., Wysoka, ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków
 Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

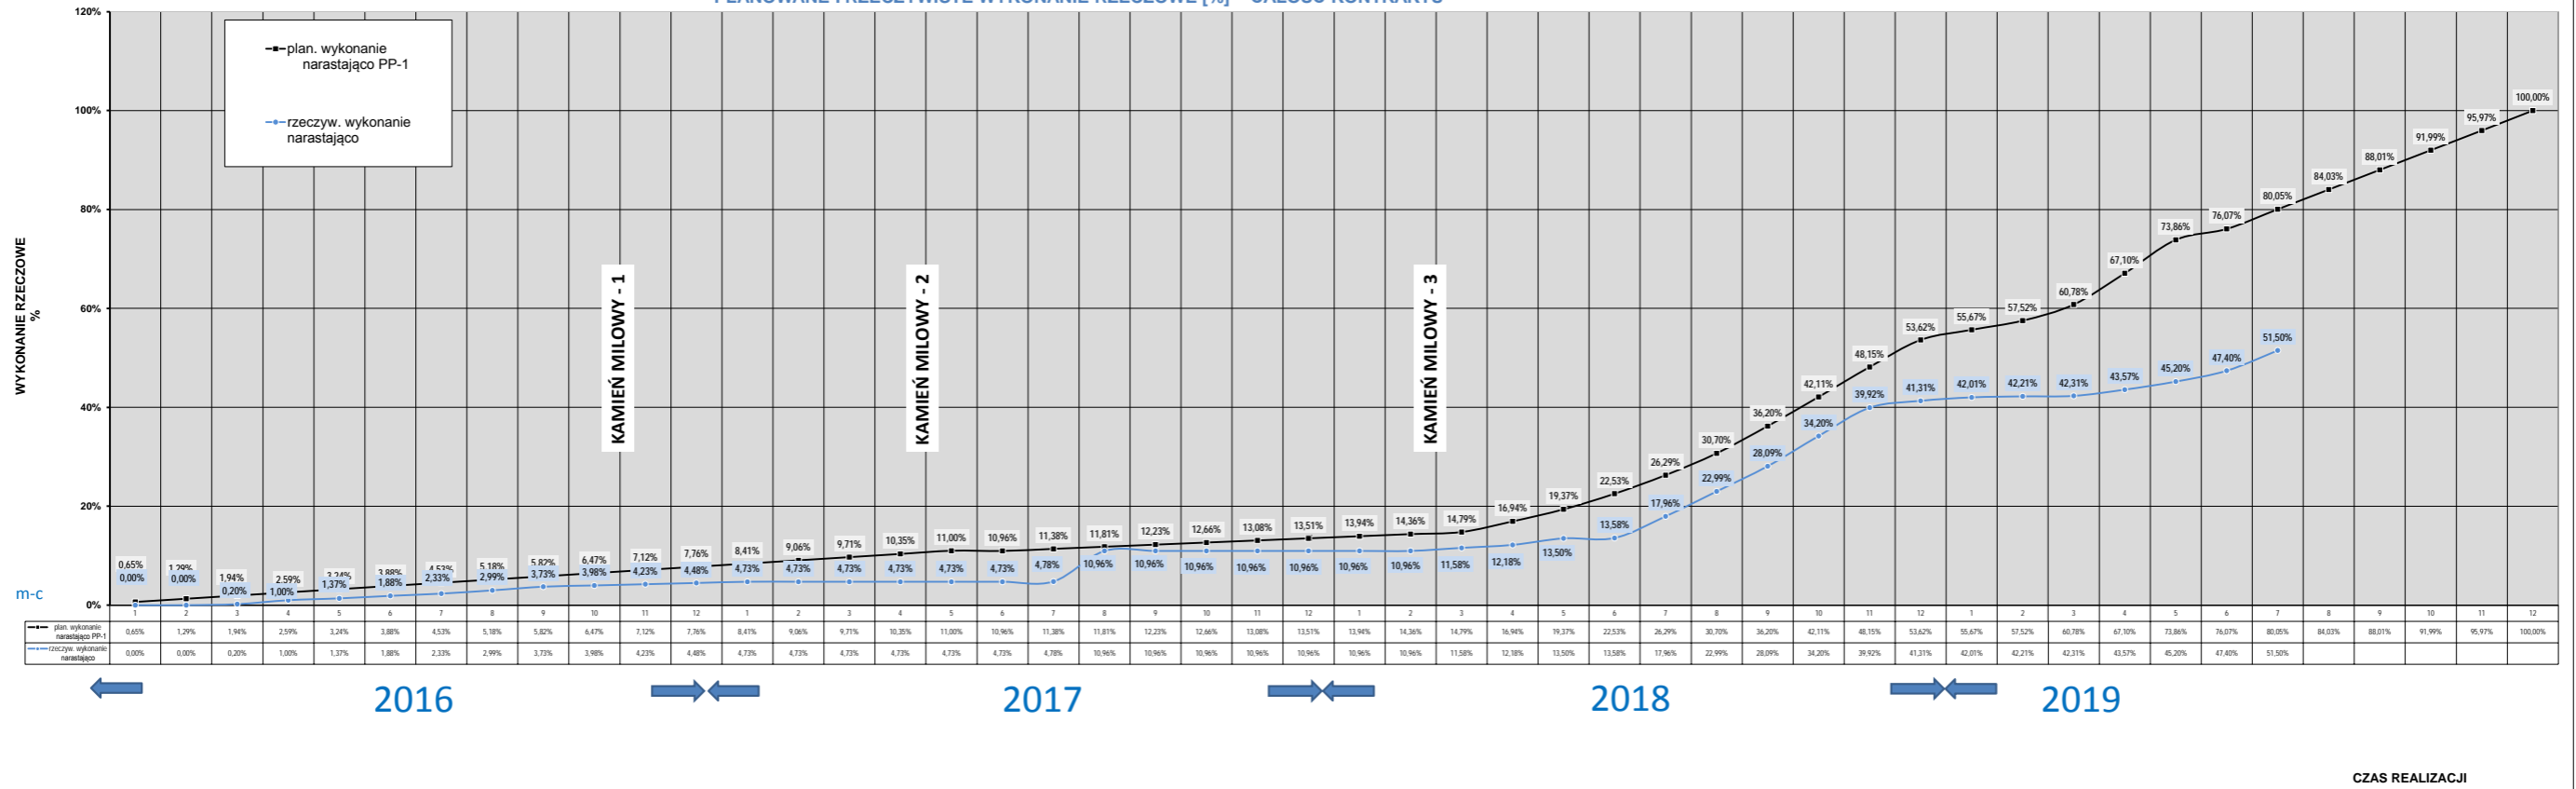

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wykonanie w m-cu	0.65%	1.20%	1.94%	2.59%	3.24%	3.88%	4.53%	5.18%	5.82%	6.47%	7.12%	7.76%	8.41%	9.06%	9.71%	10.35%	11.00%	10.96%	11.38%	11.81%	12.23%	12.66%	13.08%	13.51%	13.94%	14.36%	14.79%	16.94%	19.37%	22.53%	26.29%	30.70%	36.20%	42.11%	48.15%	53.62%	55.67%	57.52%	60.78%	67.10%	73.86%	76.07%	80.05%	84.03%	88.01%	91.99%	95.97%	100.00%
Realizacja planu	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.65%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	0.43%	2.15%	2.44%	3.16%	3.76%	4.41%	5.50%	5.91%	6.04%	5.47%	2.05%	1.85%	3.26%	6.31%	6.76%	2.21%	3.98%	3.98%	3.98%	3.98%	4.03%	
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	0.65%	1.20%	1.94%	2.59%	3.24%	3.88%	4.53%	5.18%	5.82%	6.47%	7.12%	7.76%	8.41%	9.06%	9.71%	10.35%	11.00%	10.96%	11.38%	11.81%	12.23%	12.66%	13.08%	13.51%	13.94%	14.36%	14.79%	16.94%	19.37%	22.53%	26.29%	30.70%	36.20%	42.11%	48.15%	53.62%	55.67%	57.52%	60.78%	67.10%	73.86%	76.07%	80.05%	84.03%	88.01%	91.99%	95.97%	100.00%
plan. wykonanie narastająco PP-1	0.65%	1.20%	1.94%	2.59%	3.24%	3.88%	4.53%	5.18%	5.82%	6.47%	7.12%	7.76%	8.41%	9.06%	9.71%	10.35%	11.00%	10.96%	11.38%	11.81%	12.23%	12.66%	13.08%	13.51%	13.94%	14.36%	14.79%	16.94%	19.37%	22.53%	26.29%	30.70%	36.20%	42.11%	48.15%	53.62%	55.67%	57.52%	60.78%	67.10%	73.86%	76.07%	80.05%	84.03%	88.01%	91.99%	95.97%	100.00%
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0.00%	0.00%	0.20%	0.80%	0.37%	0.51%	0.65%	0.66%	0.74%	0.25%	0.25%	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	6.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.60%	1.32%	0.08%	4.38%	5.03%	5.10%	6.11%	5.72%	1.39%	0.70%	0.20%	0.10%	1.26%	1.63%	2.20%	4.10%					
rzeczyw. wykonanie narastająco	0.00%	0.00%	0.20%	1.00%	1.37%	1.88%	2.33%	2.99%	3.73%	3.98%	4.23%	4.48%	4.73%	4.73%	4.73%	4.73%	4.73%	4.73%	4.78%	10.96%	10.96%	10.96%	10.96%	10.96%	10.96%	10.96%	11.58%	12.18%	13.50%	17.96%	22.99%	28.09%	34.20%	39.92%	41.31%	42.01%	42.21%	42.31%	43.57%	45.20%	47.40%	51.50%						
