

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kolbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług. ok. 15,151 km.

Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21.


ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN] STAN NA DZIEŃ 31.10.2019 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
NIP: 734-24-80-395

Wykonawca Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław



PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

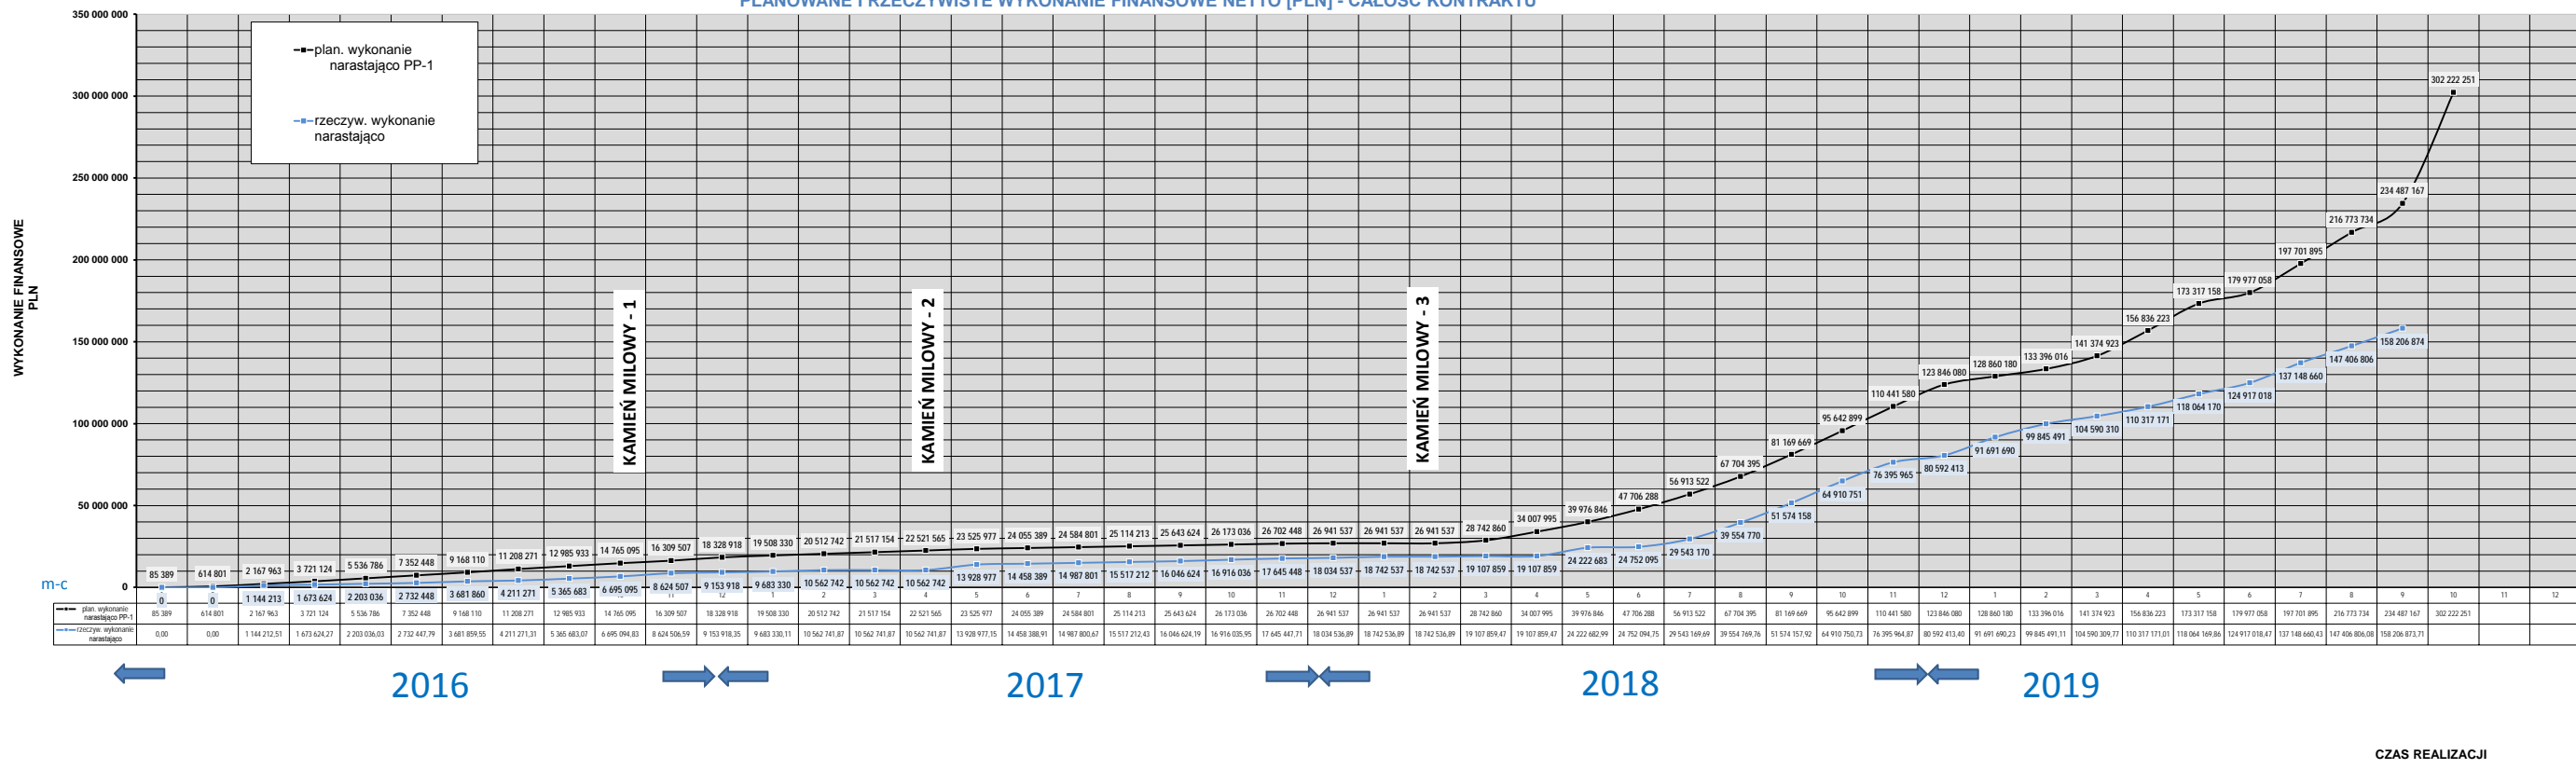

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Wykonanie w m-cu	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	302 222 251					
Realizacja płatności	0	0	1 144 213	1 673 624	2 203 036	2 732 448	3 681 860	4 211 271	5 365 683	6 695 095	8 624 507	9 153 918	9 683 330	10 562 742	10 562 742	10 562 742	13 928 977	14 458 389	14 987 801	15 517 212	16 046 624	16 916 036	17 445 448	18 034 537	18 742 537	19 107 859	19 107 859	24 222 683	24 752 095	29 543 170	39 554 770	51 574 158	64 910 751	76 395 965	80 592 413	91 691 690	99 845 491	104 590 310	110 317 171	118 064 170	124 917 018	137 148 660	147 406 806	158 206 874							
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	302 222 251					
plan. wykonanie narastająco PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	302 222 251					
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 213,1	1 673 624,2	2 203 036,3	2 732 448,3	3 681 860,3	4 211 271,3	5 365 683,3	6 695 095,3	8 624 507,3	9 153 918,3	9 683 330,3	10 562 742,3	10 562 742,3	10 562 742,3	13 928 977,3	14 458 389,3	14 987 801,3	15 517 212,3	16 046 624,3	16 916 036,3	17 445 448,3	18 034 537,3	18 742 537,3	19 107 859,3	19 107 859,3	24 222 683,3	24 752 095,3	29 543 170,3	39 554 770,3	51 574 158,3	64 910 751,3	76 395 965,3	80 592 413,3	91 691 690,3	99 845 491,3	104 590 310,3	110 317 171,3	118 064 170,3	124 917 018,3	137 148 660,3	147 406 806,3	158 206 874,3							
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	1 144 213,1	1 673 624,2	2 203 036,3	2 732 448,3	3 681 860,3	4 211 271,3	5 365 683,3	6 695 095,3	8 624 507,3	9 153 918,3	9 683 330,3	10 562 742,3	10 562 742,3	10 562 742,3	13 928 977,3	14 458 389,3	14 987 801,3	15 517 212,3	16 046 624,3	16 916 036,3	17 445 448,3	18 034 537,3	18 742 537,3	19 107 859,3	19 107 859,3	24 222 683,3	24 752 095,3	29 543 170,3	39 554 770,3	51 574 158,3	64 910 751,3	76 395 965,3	80 592 413,3	91 691 690,3	99 845 491,3	104 590 310,3	110 317 171,3	118 064 170,3	124 917 018,3	137 148 660,3	147 406 806,3	158 206 874,3							
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	0,91%	1,22%	1,40%	1,78%	2,22%	2,86%	3,04%	3,21%	3,51%	3,51%	4,62%	4,80%	4,98%	5,15%	5,33%	5,62%	5,86%	5,99%	6,22%	6,22%	6,34%	6,34%	6,04%	8,22%	9,81%	13,13%	17,12%	21,55%	25,36%	26,76%	30,44%	33,15%	34,72%	36,63%	39,20%	41,47%	45,53%	48,94%	52,52%							
% wykonania harm. w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	73,67%	34,09%	29,16%	29,16%	52,29%	25,95%	64,94%	74,72%	124,93%	26,22%	44,89%	87,55%	0,00%	0,00%	335,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164,22%	137,78%	162,74%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
% wykonania harm. narastająco	0,00%	0,00%	52,78%	44,98%	39,79%	37,16%	40,16%	37,57%	41,32%	45,34%	52,88%	49,94%	49,64%	51,49%	49,09%	46,90%	59,21%	60,10%	60,96%	61,79%	62,58%	64,63%	66,08%	66,94%	69,57%	69,57%	66,48%	56,19%	60,59%	51,88%	51,91%	58,42%	63,54%	67,87%	69,17%	65,07%	71,16%	74,85%	73,98%	70,34%	68,12%	69,41%	69,37%	68,00%	67,47%						
KM-1	0,05%	0,35%	1,25%	2,15%	3,19%	4,24%	5,29%	6,47%	7,49%	8,52%	9,41%	10,58%	11,26%	11,84%	12,41%	12,99%	13,57%	13,88%	14,18%	14,49%	14,80%	15,10%	15,41%	15,54%	15,54%	15,54%	16,58%	19,62%	23,07%	27,53%	32,84%	39,06%	46,83%	55,18%	63,72%	71,46%	74,35%	76,97%	81,57%	90,49%	100,00%										
KM-2	25,08947,27	317,40844,07	3008,795,85	48593964,31	59918862,49	73191635,97	89793922,26	107559995,85	125758373,24	142245908,15	148413251,78	153992329,16	163806384,84	162823783,80	370 482 448,43																																				
KM-3	205,42859,57	29808995,18	31777846,22	39507288,06	48714622,35	59505395,1	72970668,5	87443899,07	102242978,9	115647078,8	120681180,3	125197015,6	133175922,7	14863222,8	301 205 241,00																																				
1801322,68	5285135,61	996891,04	772941,84	9207234,29	10790872,75	13489273,41	14473230,56	14799880,80	15424498,30	5014100,51	4536030,27	7978907,14	15 461 299,89	152 968 018,40																																					

3012052
