

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
 Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kotłbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, długość ok. 15,151km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.


**ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU [%]
 STAN NA DZIEŃ 30.11.2018**

Inżynier: MGPP S.A.
 ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
 NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., Wysoka, ul. Parzewska 10, 05-800 Pruszków
 Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław



PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

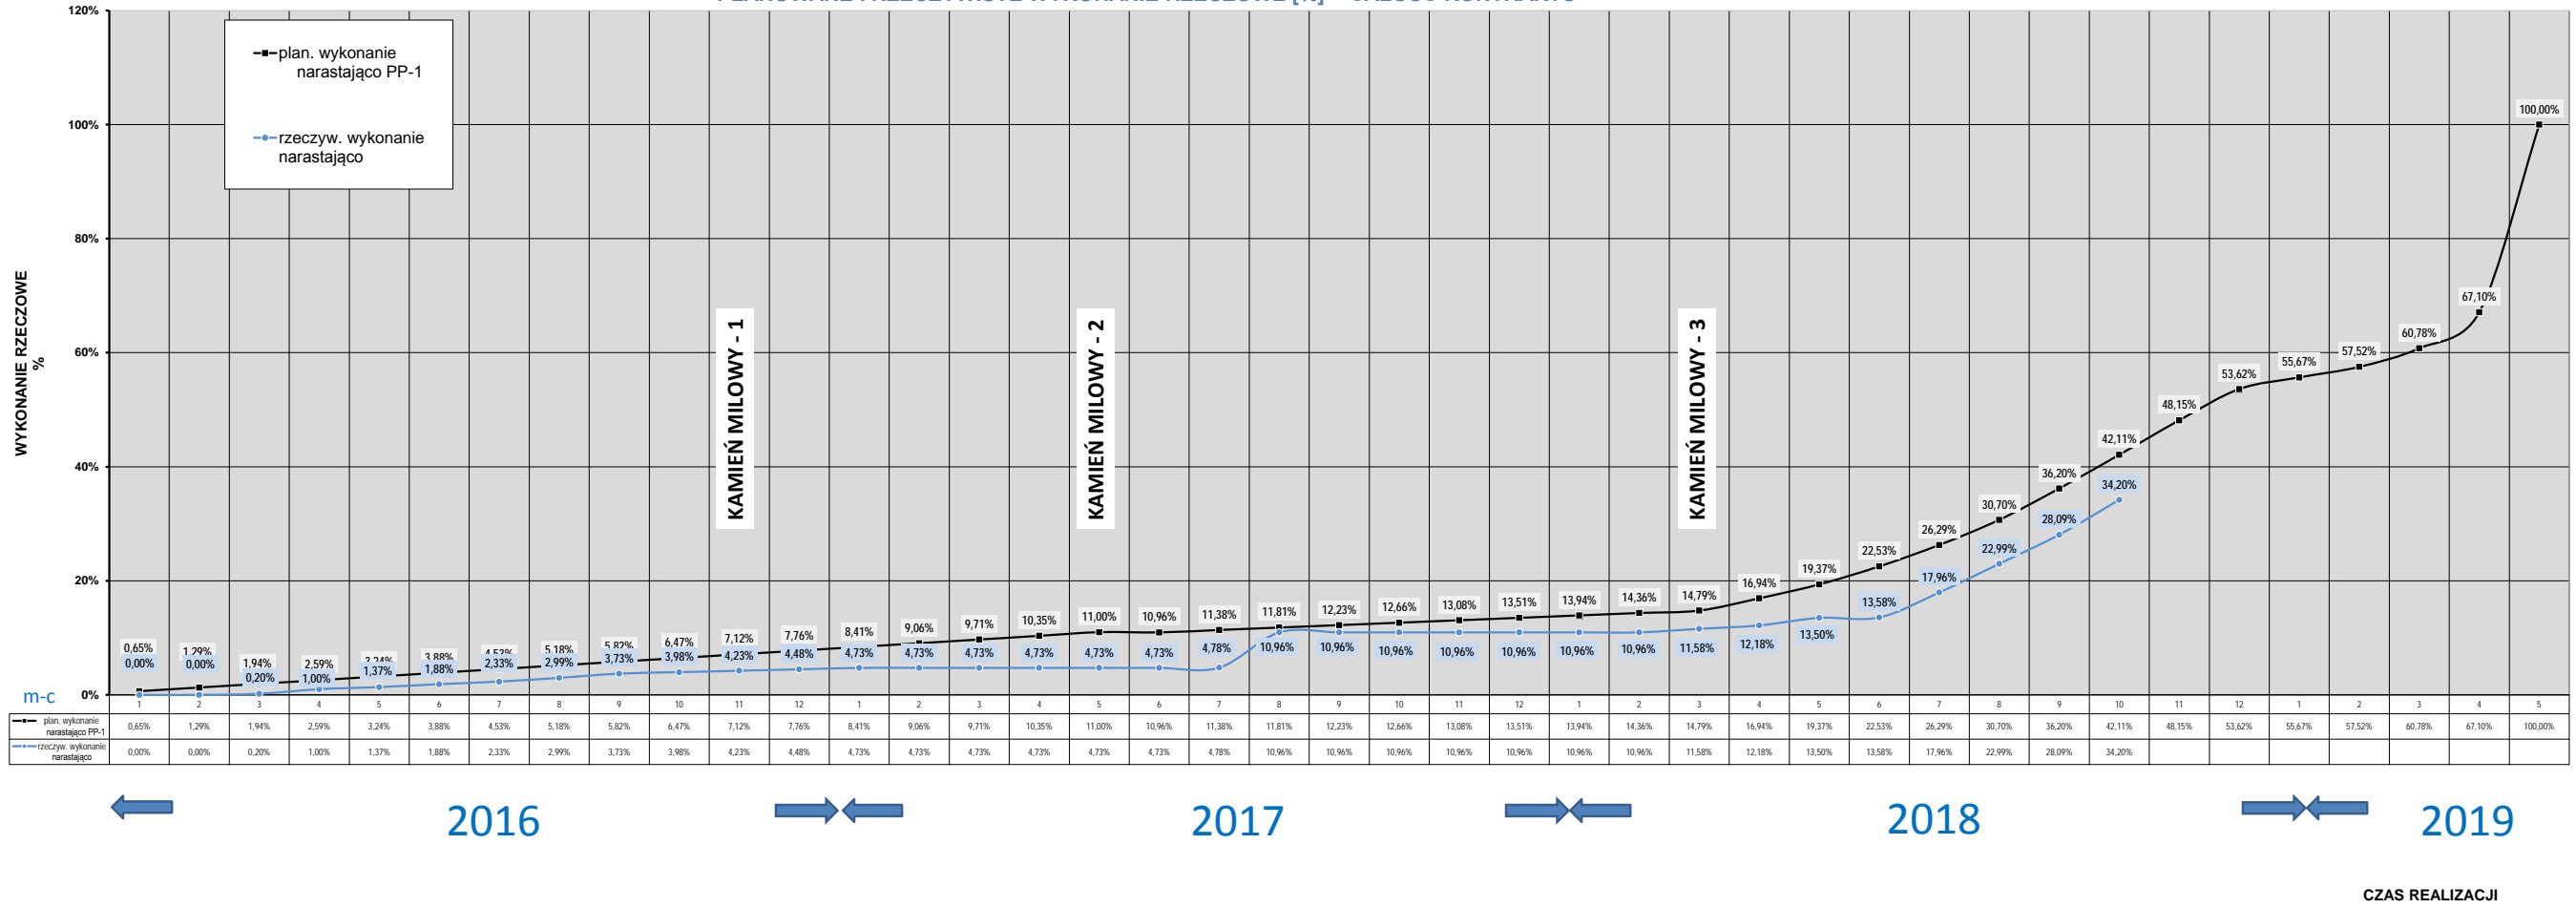

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
Wykonanie w m-cu	0,65%	1,29%	1,94%	2,59%	3,24%	3,88%	4,53%	5,18%	5,82%	6,47%	7,12%	7,76%	8,41%	9,06%	9,71%	10,35%	11,00%	10,96%	11,38%	11,81%	12,23%	12,66%	13,08%	13,51%	13,94%	14,36%	14,79%	16,94%	19,37%	22,53%	26,29%	30,70%	36,20%	42,11%	48,15%	53,62%	55,67%	57,52%	60,78%	67,10%	100,00%	
Realizacja płatności	0,00%	0,00%	0,20%	1,00%	1,37%	1,88%	2,33%	2,99%	3,73%	3,98%	4,23%	4,48%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,78%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	11,58%	12,18%	13,50%	13,58%	17,96%	22,99%	28,09%	34,20%							
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	2,15%	2,44%	3,16%	3,76%	4,41%	5,50%	5,91%	6,04%	5,47%	2,05%	1,85%	3,26%	6,31%	32,90%
plan. wykonanie narastająco PP-1	0,65%	1,29%	1,94%	2,59%	3,24%	3,88%	4,53%	5,18%	5,82%	6,47%	7,12%	7,76%	8,41%	9,06%	9,71%	10,35%	11,00%	10,96%	11,38%	11,81%	12,23%	12,66%	13,08%	13,51%	13,94%	14,36%	14,79%	16,94%	19,37%	22,53%	26,29%	30,70%	36,20%	42,11%	48,15%	53,62%	55,67%	57,52%	60,78%	67,10%	100,00%	
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	0,37%	0,51%	0,45%	0,66%	0,74%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,60%	1,32%	0,08%	4,38%	5,03%	5,10%	6,11%							
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00%	0,00%	0,20%	1,00%	1,37%	1,88%	2,33%	2,99%	3,73%	3,98%	4,23%	4,48%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,78%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	11,58%	12,18%	13,50%	13,58%	17,96%	22,99%	28,09%	34,20%							
