Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług.ok.15,151km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN]
STAN NA DZIEŃ 28.02.2021 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier: MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

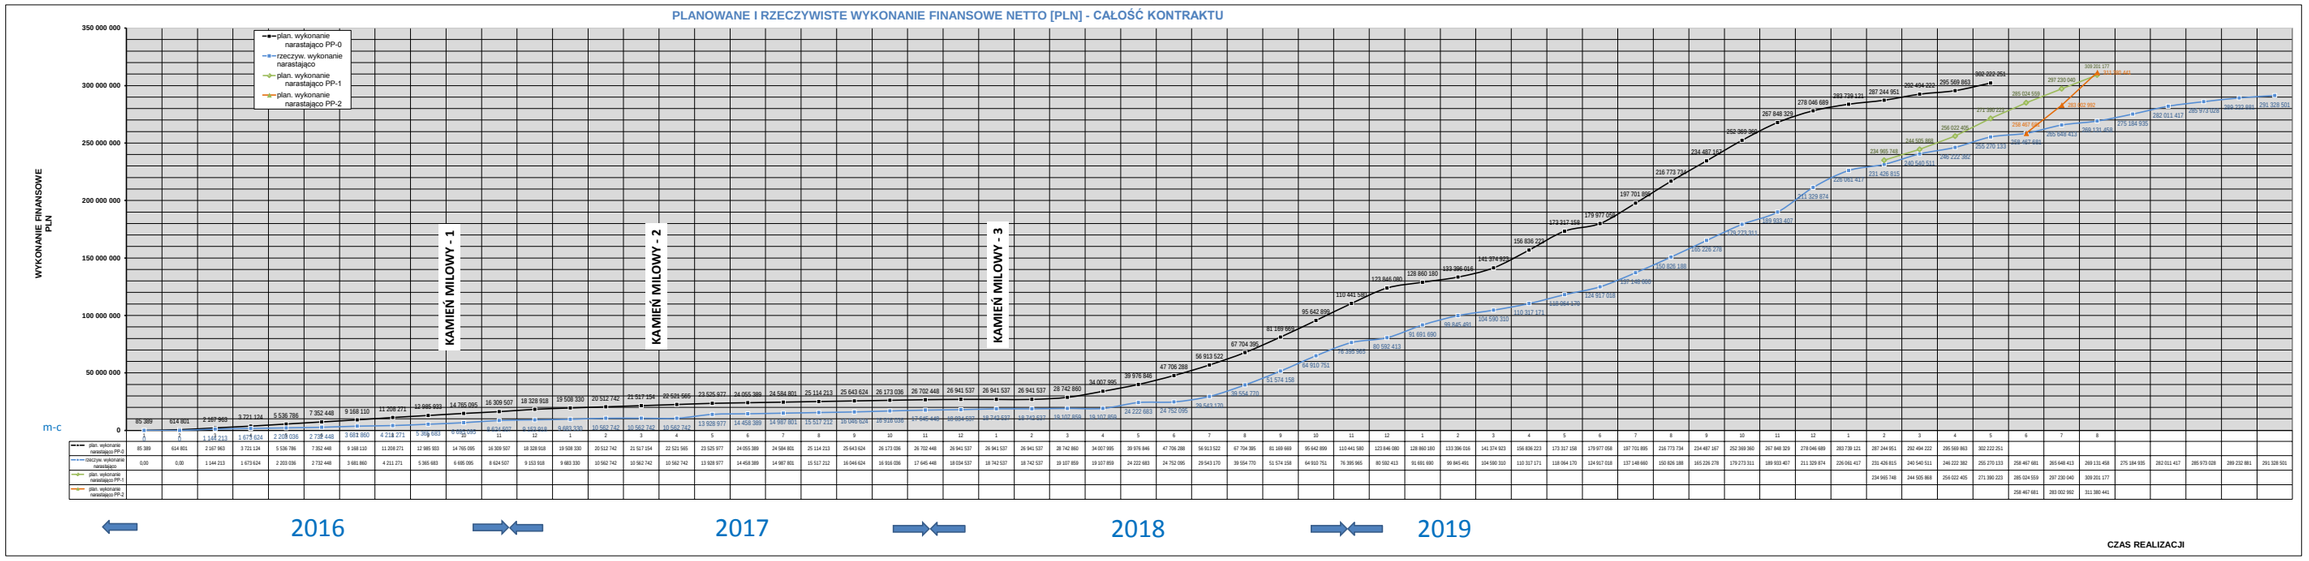

KWOTY NETTO	2016												2017											
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	85 389	529 412	1 593 162	1 915 162	1 815 662	1 815 662	1 815 662	2 040 162	1 777 662	1 779 162	1 544 412	2 019 412	1 179 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	259 088
plan. wykonanie narastająco PP-0	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 213	1 673 624	2 203 036	2 732 448	3 681 860	4 211 271	5 365 683	6 695 095	8 624 507	9 153 918	9 683 330	10 562 742	10 562 742	10 562 742	13 928 977	14 458 389	14 987 801	15 517 212	16 046 624	16 916 036	17 645 448	18 034 537
rzeczyw. wykonanie narastająco																								
plan. wykonanie miesięcznie PP-1																								
plan. wykonanie narastająco PP-1																								
plan. wykonanie miesięcznie PP-2																								
plan. wykonanie narastająco PP-2																								

KWOTY NETTO	2018												2019											
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	6	0	1 891 323	5 265 136	5 968 851	7 729 442	9 207 234	10 790 873	11 465 273	14 473 231	14 786 681	13 404 500	5 014 101	4 535 835	7 978 907	15 461 300	16 480 936	6 659 899	17 724 837	19 071 640	17 713 433	17 882 192	15 479 969	10 168 360
plan. wykonanie narastająco PP-0	36 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	252 369 360	267 848 329	278 046 689
plan. wykonanie miesięcznie PP-1																								
plan. wykonanie narastająco PP-1																								
plan. wykonanie miesięcznie PP-2																								
plan. wykonanie narastająco PP-2																								

KWOTY NETTO	2020												2021	
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	3 630 402	3 505 830	5 246 271	3 075 641	6 652 388									
plan. wykonanie narastająco PP-0	283 739 121	287 244 951	292 494 222	295 569 863	302 222 251									
plan. wykonanie miesięcznie PP-1			9 540 120	11 516 537	15 367 819	13 634 336	12 205 481	11 971 137						
plan. wykonanie narastająco PP-1		234 965 748	244 505 868	256 022 405	271 390 223	285 024 559	297 230 040	309 201 177						
plan. wykonanie miesięcznie PP-2							24 535 311	28 377 448						
plan. wykonanie narastająco PP-2						258 467 681	283 002 992	311 380 441						
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	14 731 543	5 365 399	9 113 687	5 681 871	9 047 751	3 187 546	7 180 732	3 483 045	6 053 477	6 826 462	3 961 610	3 259 853	2 095 620	
rzeczyw. wykonanie narastająco	226 061 417	231 426 815	240 540 511	246 222 382	255 270 133	258 457 681	265 648 413	269 131 458	275 184 935	282 011 417	285 973 028	289 232 881	291 328 501	
% zaawansowania kontraktu	67,44%	68,78%	77,79%	79,63%	82,56%	83,01%	85,31%	86,43%	88,38%	90,57%	91,84%	92,89%	93,56%	
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
% wykonania harm. narastająco	79,67%	98,49%	98,38%	96,17%	94,06%	90,68%	93,87%	86,43%	88,38%	90,57%	91,84%	92,89%	93,56%	

KM-1 KM-2 KM-3
