Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kolbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług.ok.15,151km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN]
STAN NA DZIEŃ 30.04.2020 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

MGGP GRUPA MGGP
STRABAG

##########

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

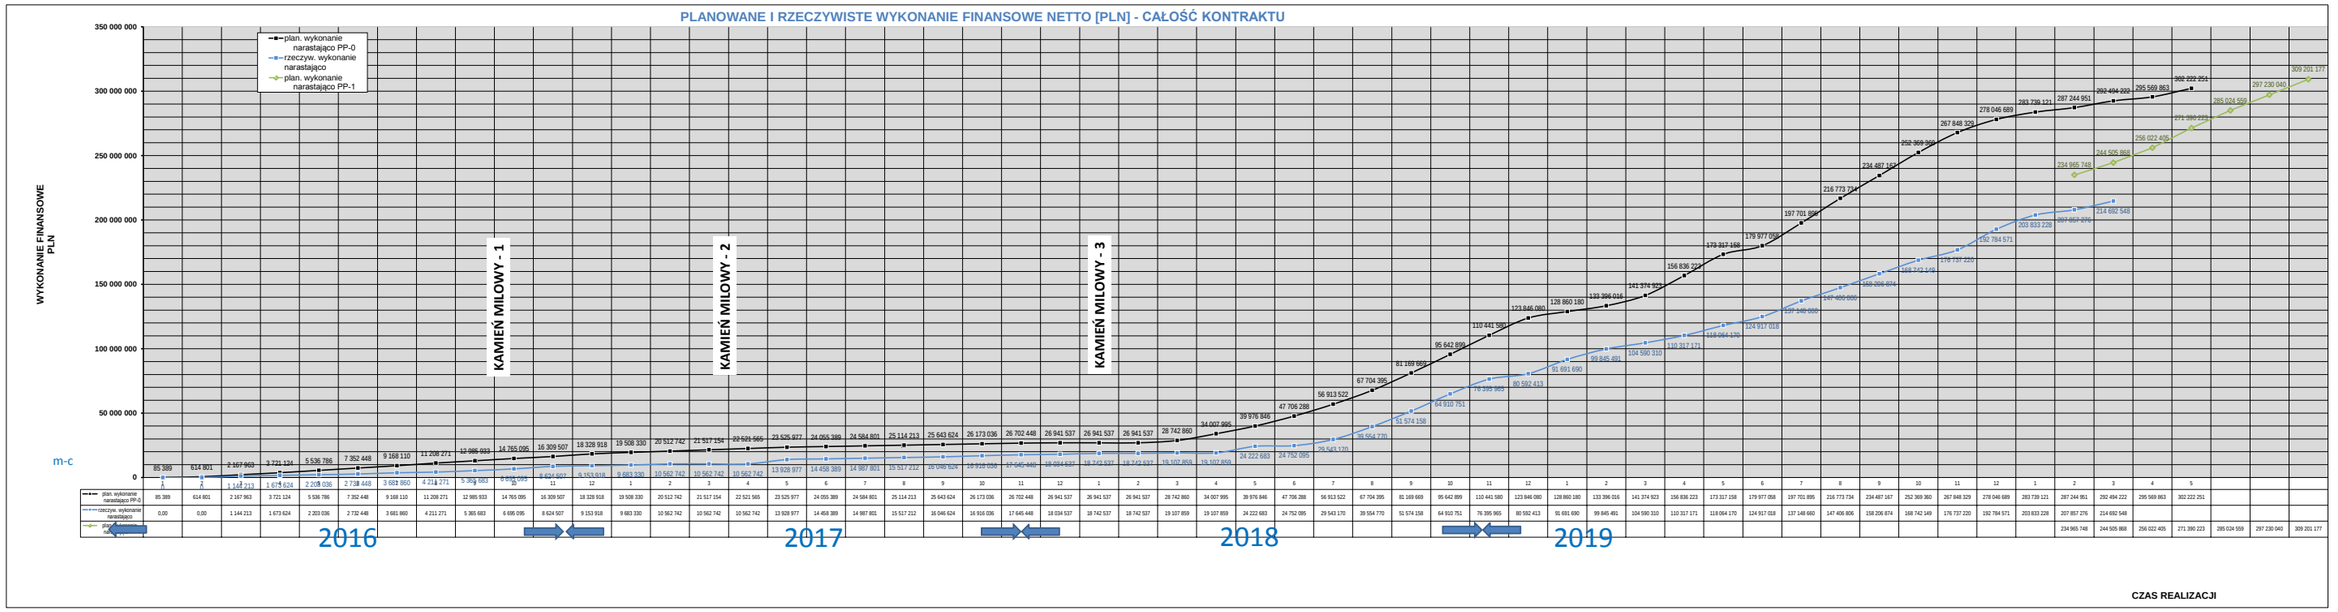

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019												2020								
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	85 389	529 412	1 553 162	1 553 162	1 815 662	1 815 662	1 815 662	2 040 162	1 777 662	1 779 162	1 544 412	2 019 412	1 179 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	239 089	0	0	1 801 323	5 265 136	5 968 851	7 729 642	9 207 234	10 790 873	13 465 273	14 473 231	14 798 681	13 404 500	5 014 101	4 535 835	7 978 907	15 461 300	16 480 836	6 659 899	17 724 837	19 071 840	17 713 433	17 882 192	15 479 969	10 198 360	5 682 432	3 555 830	5 249 271	3 075 641	6 652 388						
plan. wykonanie narastająco PP-0	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	252 369 360	267 848 329	278 046 689	283 739 121	287 244 951	292 494 222	295 569 863	302 222 251						
plan. wykonanie miesięcznie PP-1																																																										
plan. wykonanie narastająco PP-1																																																										
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 213	529 412	529 412	529 412	949 412	529 412	1 154 412	1 329 412	1 929 412	529 412	529 412	879 412	0	0	3 366 235	529 412	529 412	529 412	529 412	869 412	729 412	389 089	708 000	0	365 323	0	5 114 824	529 412	4 791 075	10 011 600	12 019 388	13 336 593	11 485 214	4 196 449	11 099 277	8 153 801	4 744 819	5 726 861	7 746 999	6 852 849	12 231 642	10 258 146	10 800 068	10 535 275	7 995 072	16 047 350	11 948 657	4 024 048	6 835 272						
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	1 144 213	1 673 624	2 203 036	2 732 448	3 681 860	4 211 271	5 365 683	6 695 095	8 624 507	9 153 918	9 683 330	10 562 742	10 562 742	10 562 742	13 928 977	14 458 389	14 987 801	15 517 212	16 046 624	16 916 036	17 645 448	18 034 537	18 742 537	18 742 537	19 107 859	19 107 859	24 222 683	24 752 095	29 543 170	39 554 770	51 574 158	64 910 751	76 395 965	80 592 413	91 691 690	99 845 491	104 590 310	110 317 171	118 064 170	124 917 018	137 148 660	147 406 806	158 206 874	168 742 149	176 737 220	192 784 571	203 833 228	207 857 276	214 692 548						
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	0,91%	1,22%	1,40%	1,78%	2,22%	2,86%	3,04%	3,21%	3,51%	3,51%	3,51%	4,62%	4,80%	4,98%	5,15%	5,33%	5,62%	5,86%	5,99%	6,22%	6,22%	6,34%	6,34%	8,04%	8,22%	9,81%	13,13%	17,12%	21,55%	25,36%	26,76%	30,44%	33,15%	34,72%	36,63%	39,20%	41,47%	45,53%	48,94%	52,52%	55,83%	58,48%	63,79%	67,44%	68,78%	69,43%						
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	73,67%	34,09%	29,16%	29,16%	52,29%	25,95%	64,94%	74,72%	124,93%	26,22%	44,89%	87,55%	0,00%	0,00%	335,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164,22%	137,78%	162,74%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
% wykonania harm. narastająco	**0,00%**	**0,00%**	**52,78%**	**44,98%**	**39,79%**	**37,16%**	**40,16%**	**37,57%**	**41,32%**	**45,34%**	**52,88%**	**49,94%**	**49,64%**	**51,49%**	**49,09%**	**46,90%**	**59,21%**	**60,10%**	60,96%	61,79%	62,58%	64,63%	66,08%	66,94%	69,57%	69,57%	66,48%	56,19%	60,59%	51,88%	51,91%	58,42%	63,54%	67,87%	69,17%	65,07%	71,16%	74,85%	73,98%	70,34%	68,12%	69,41%	69,37%	68,00%	67,47%	66,86%	65,98%	69,34%	71,84%	72,36%	87,81%						
											KM-1												***KM-2***											***KM-3***																				
