Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług.ok.15,151km.

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN]
STAN NA DZIEŃ 30.09.2020 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier: MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
NIP: 734-24-80-395

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

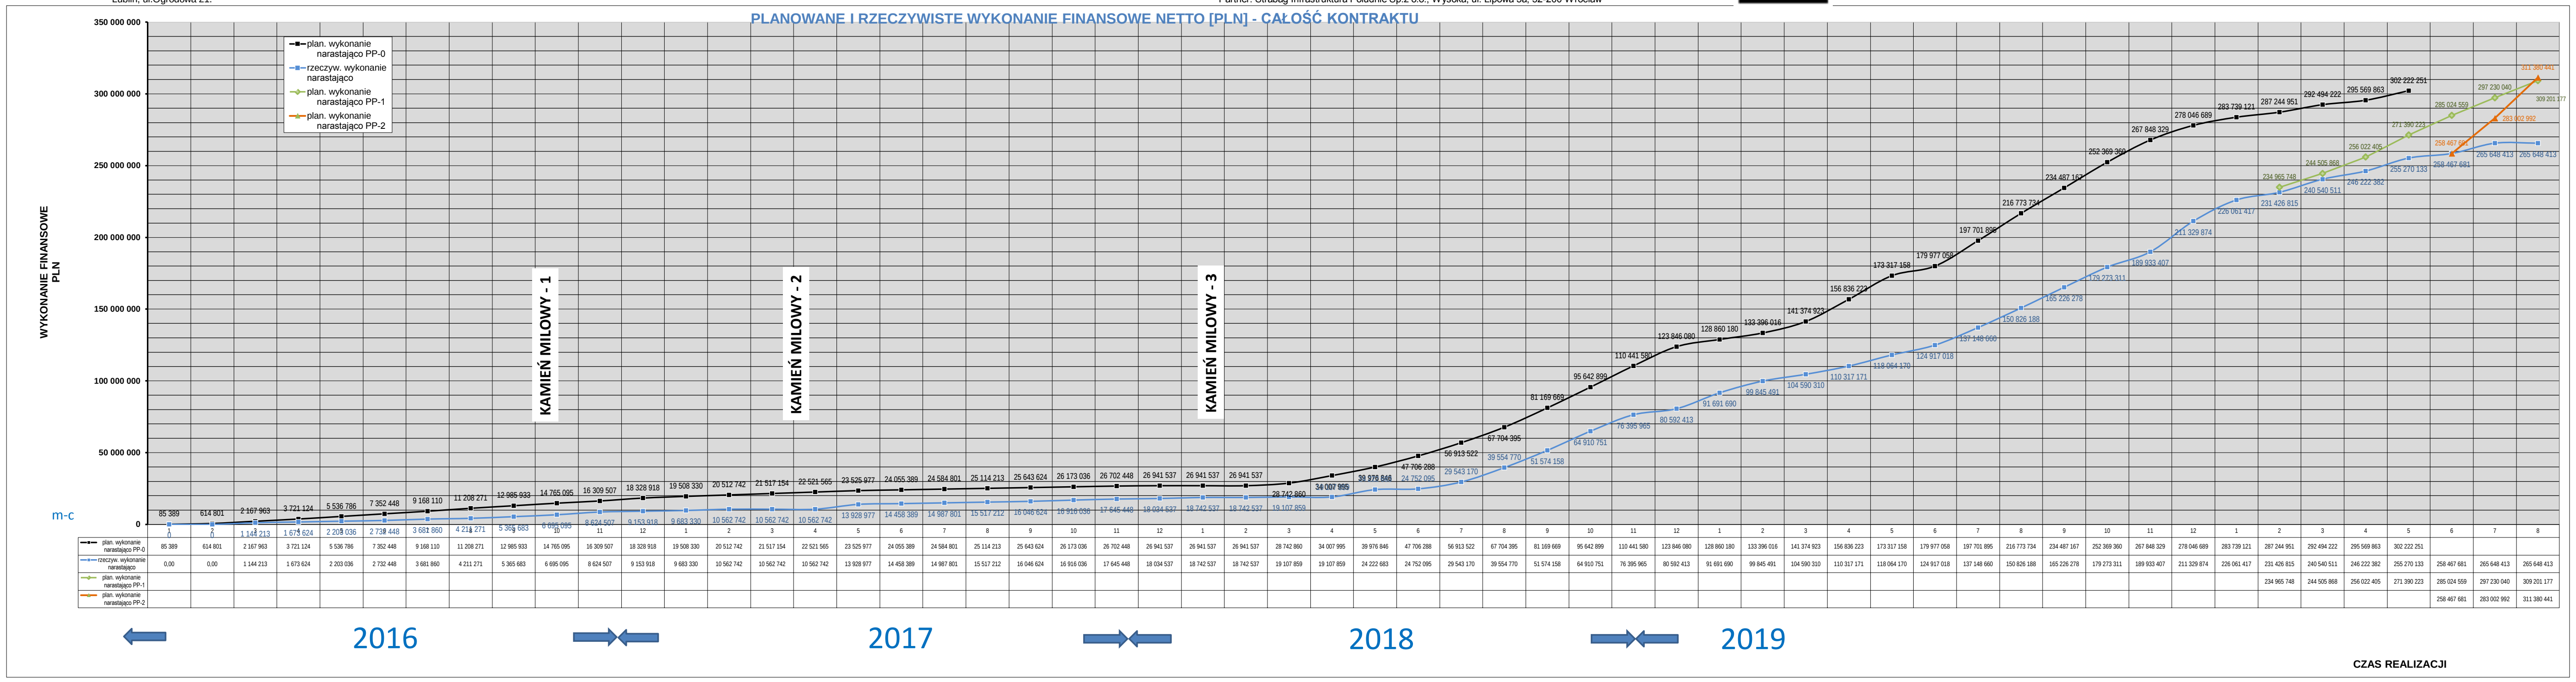

KWOTY NETTO – 2016

KWOTY NETTO												
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	85 389	529 412	1 553 162	1 553 162	1 815 662	1 815 662	1 815 662	2 040 162	1 777 662	1 779 162	1 544 412	2 019 412
plan. wykonanie narastająco PP-0	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918
plan. wykonanie miesięcznie PP-1												
plan. wykonanie narastająco PP-1												
plan. wykonanie miesięcznie PP-2												
plan. wykonanie narastająco PP-2												
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 213	529 412	529 412	529 412	949 412	529 412	1 154 412	1 329 412	1 929 412	529 412
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	1 144 213	1 673 624	2 203 036	2 732 448	3 681 860	4 211 271	5 365 683	6 695 095	8 624 507	9 153 918
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	0,91%	1,22%	1,40%	1,78%	2,22%	2,86%	3,04%
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	73,67%	34,09%	29,16%	29,16%	52,29%	25,95%	64,94%	74,72%	124,93%	26,22%
% wykonania harm. narastająco	0,00%	0,00%	52,78%	44,98%	39,79%	37,16%	40,16%	37,57%	41,32%	45,34%	52,88%	49,94%
											KM-1	

2017

KWOTY NETTO												
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	1 179 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	239 089
plan. wykonanie narastająco PP-0	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537
plan. wykonanie miesięcznie PP-1												
plan. wykonanie narastająco PP-1												
plan. wykonanie miesięcznie PP-2												
plan. wykonanie narastająco PP-2												
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	529 412	879 412	0	0	3 366 235	529 412	529 412	529 412	529 412	869 412	729 412	389 089
rzeczyw. wykonanie narastająco	9 683 330	10 562 742	10 562 742	10 562 742	13 928 977	14 458 389	14 987 801	15 517 212	16 046 624	16 916 036	17 645 448	18 034 537
% zaawansowania kontraktu	3,21%	3,51%	3,51%	3,51%	4,62%	4,80%	4,98%	5,15%	5,33%	5,62%	5,86%	5,99%
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	44,89%	87,55%	0,00%	0,00%	335,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164,22%	137,78%	162,74%
% wykonania harm. narastająco	49,64%	51,49%	49,09%	46,90%	59,21%	60,10%	60,96%	61,79%	62,58%	64,63%	66,08%	66,94%
					KM-2							

2018

KWOTY NETTO												
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	0	0	1 801 323	5 265 136	5 968 851	7 729 442	9 207 234	10 790 873	13 465 273	14 473 231	14 798 681	13 404 500
plan. wykonanie narastająco PP-0	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080
plan. wykonanie miesięcznie PP-1												
plan. wykonanie narastająco PP-1												
plan. wykonanie miesięcznie PP-2												
plan. wykonanie narastająco PP-2												
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	708 000	0	365 323	0	5 114 824	529 412	4 791 075	10 011 600	12 019 388	13 336 593	11 485 214	4 196 449
rzeczyw. wykonanie narastająco	18 742 537	18 742 537	19 107 859	19 107 859	24 222 683	24 752 095	29 543 170	39 554 770	51 574 158	64 910 751	76 395 965	80 592 413
% zaawansowania kontraktu	6,22%	6,22%	6,34%	6,34%	8,04%	8,22%	9,81%	13,13%	17,12%	21,55%	25,36%	26,76%
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
% wykonania harm. narastająco	69,57%	69,57%	66,48%	56,19%	60,59%	51,88%	51,91%	58,42%	63,54%	67,87%	69,17%	65,07%
			KM-3									

2019

KWOTY NETTO												
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	5 014 101	4 535 835	7 978 907	15 461 300	16 480 936	6 659 899	17 724 837	19 071 840	17 713 433	17 882 192	15 478 969	10 198 360
plan. wykonanie narastająco PP-0	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	252 369 360	267 848 329	278 046 689
plan. wykonanie miesięcznie PP-1												
plan. wykonanie narastająco PP-1												
plan. wykonanie miesięcznie PP-2												
plan. wykonanie narastająco PP-2												
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	11 099 277	8 153 801	4 744 819	5 726 861	7 746 999	6 852 849	12 231 642	13 677 528	14 400 090	14 047 033	10 660 096	21 396 467
rzeczyw. wykonanie narastająco	91 691 690	99 845 491	104 590 310	110 317 171	118 064 170	124 917 018	137 148 660	150 826 188	165 226 278	179 273 311	189 933 407	211 329 874
% zaawansowania kontraktu	30,44%	33,15%	34,72%	36,63%	39,20%	41,47%	45,53%	48,94%	52,52%	55,83%	58,48%	63,79%
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
% wykonania harm. narastająco	71,16%	74,85%	73,98%	70,34%	68,12%	69,41%	69,37%	69,58%	70,46%	71,04%	70,91%	76,01%

2020

KWOTY NETTO								
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	5 692 432	3 505 830	5 249 271	3 075 641	6 652 388			
plan. wykonanie narastająco PP-0	283 739 121	287 244 951	292 494 222	295 569 863	302 222 251			
plan. wykonanie miesięcznie PP-1			9 540 120	11 516 537	15 367 819	13 634 336	12 205 481	11 971 137
plan. wykonanie narastająco PP-1		234 965 748	244 505 868	256 022 405	271 390 223	285 024 559	297 230 040	309 201 177
plan. wykonanie miesięcznie PP-2							24 535 311	28 377 448
plan. wykonanie narastająco PP-2						258 467 681	283 002 992	311 380 441
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	14 731 543	5 365 398	9 113 697	5 681 871	9 047 751	3 197 548	7 180 732	0
rzeczyw. wykonanie narastająco	226 061 417	231 426 815	240 540 511	246 222 382	255 270 133	258 467 681	265 648 413	265 648 413
% zaawansowania kontraktu	67,44%	68,78%	77,79%	79,63%	82,56%	83,01%	85,31%	85,31%
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
% wykonania harm. narastająco	79,67%	98,49%	98,38%	96,17%	94,06%	90,68%	93,87%	85,31%
