Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kobiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług.ok.15,151km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE RZECZOWE KONTRAKTU [%]
STAN NA DZIEŃ 31.08.2020

Inżynier: MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów
NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., Wysoka, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o.,, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

MGGP GRUPA MGGP STRABAG

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE RZECZOWE [%] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

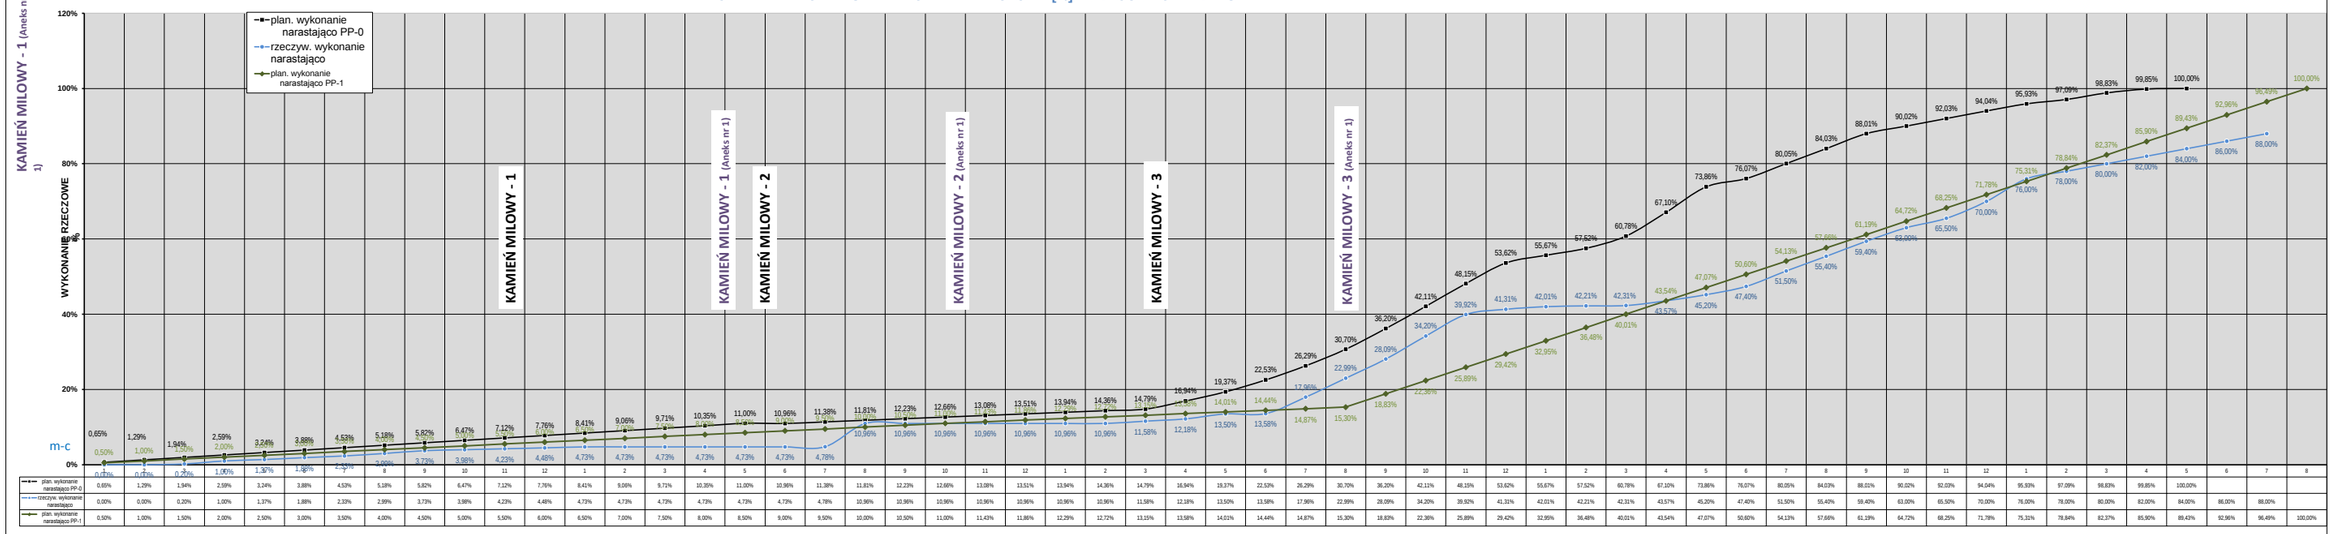

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019												2020								
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
plan. wykonanie miesięcznie PP-0	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	2,15%	2,44%	3,16%	3,76%	4,42%	5,50%	5,92%	6,04%	5,47%	2,05%	1,85%	3,26%	6,31%	6,76%	2,21%	3,98%	3,98%	3,98%	2,01%	2,01%	2,01%	1,89%	1,16%	1,74%	1,02%	0,15%								
plan. wykonanie narastająco PP-0	0,65%	1,29%	1,94%	2,59%	3,24%	3,88%	4,53%	5,18%	5,82%	6,47%	7,12%	7,76%	8,41%	9,06%	9,71%	10,35%	11,00%	10,96%	11,38%	11,81%	12,23%	12,66%	13,08%	13,51%	13,94%	14,36%	14,79%	16,94%	19,37%	22,53%	26,29%	30,70%	36,20%	42,11%	48,15%	53,62%	55,67%	57,52%	60,78%	67,10%	73,86%	76,07%	80,05%	84,03%	88,01%	90,02%	92,03%	94,04%	95,93%	97,09%	98,83%	99,85%	100,00%								
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	1,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,53%	3,51%								
plan. wykonanie narastająco PP-1	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,00%	5,50%	6,00%	6,50%	7,00%	7,50%	8,00%	8,50%	9,00%	9,50%	10,00%	10,50%	11,00%	11,43%	11,86%	12,29%	12,72%	13,15%	13,58%	14,01%	14,44%	14,87%	15,30%	18,83%	22,36%	25,89%	29,42%	32,95%	36,48%	40,01%	43,54%	47,07%	50,60%	54,13%	57,66%	61,19%	64,72%	68,25%	71,78%	75,31%	78,84%	82,37%	85,90%	89,43%	92,96%	96,49%	100,00%								
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00%	0,00%	0,20%	0,80%	0,37%	0,51%	0,45%	0,66%	0,74%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	6,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,62%	0,80%	1,32%	0,08%	4,38%	5,03%	5,10%	6,11%	5,72%	1,39%	0,70%	0,20%	0,10%	1,26%	1,63%	2,20%	4,10%	3,90%	4,00%	3,60%	2,92%	4,50%	6,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%								
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00%	0,00%	0,20%	1,00%	1,37%	1,88%	2,33%	2,99%	3,73%	3,98%	4,23%	4,48%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	4,78%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	10,96%	11,58%	12,18%	13,50%	13,58%	17,96%	22,99%	28,09%	34,20%	39,92%	41,31%	42,01%	42,21%	42,31%	43,57%	45,20%	47,40%	51,50%	55,40%	59,40%	63,00%	65,50%	70,00%	76,00%	78,00%	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%								

KM-1 | KM-1 Aneks nr1 | KM-2 | KM-2 Aneks nr1 | KM-3 | KM-3 Aneks nr1
