Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w.Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy).
Część 1: na odcinku węzeł "Lubelska" (bez węzła) - Kolbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200, dług.ok.15,151km.

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul.Ogrodowa 21.

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE KONTRAKTU [PLN]
STAN NA DZIEŃ 30.11.2019 - WG WYDANYCH PŚP

Inżynier: MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów NIP: 734-24-80-395

Wykonawca: Lider: Strabag Sp.z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Partner: Strabag Infrastruktura Południe Sp.z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

PLANOWANE I RZECZYWISTE WYKONANIE FINANSOWE NETTO [PLN] - CAŁOŚĆ KONTRAKTU

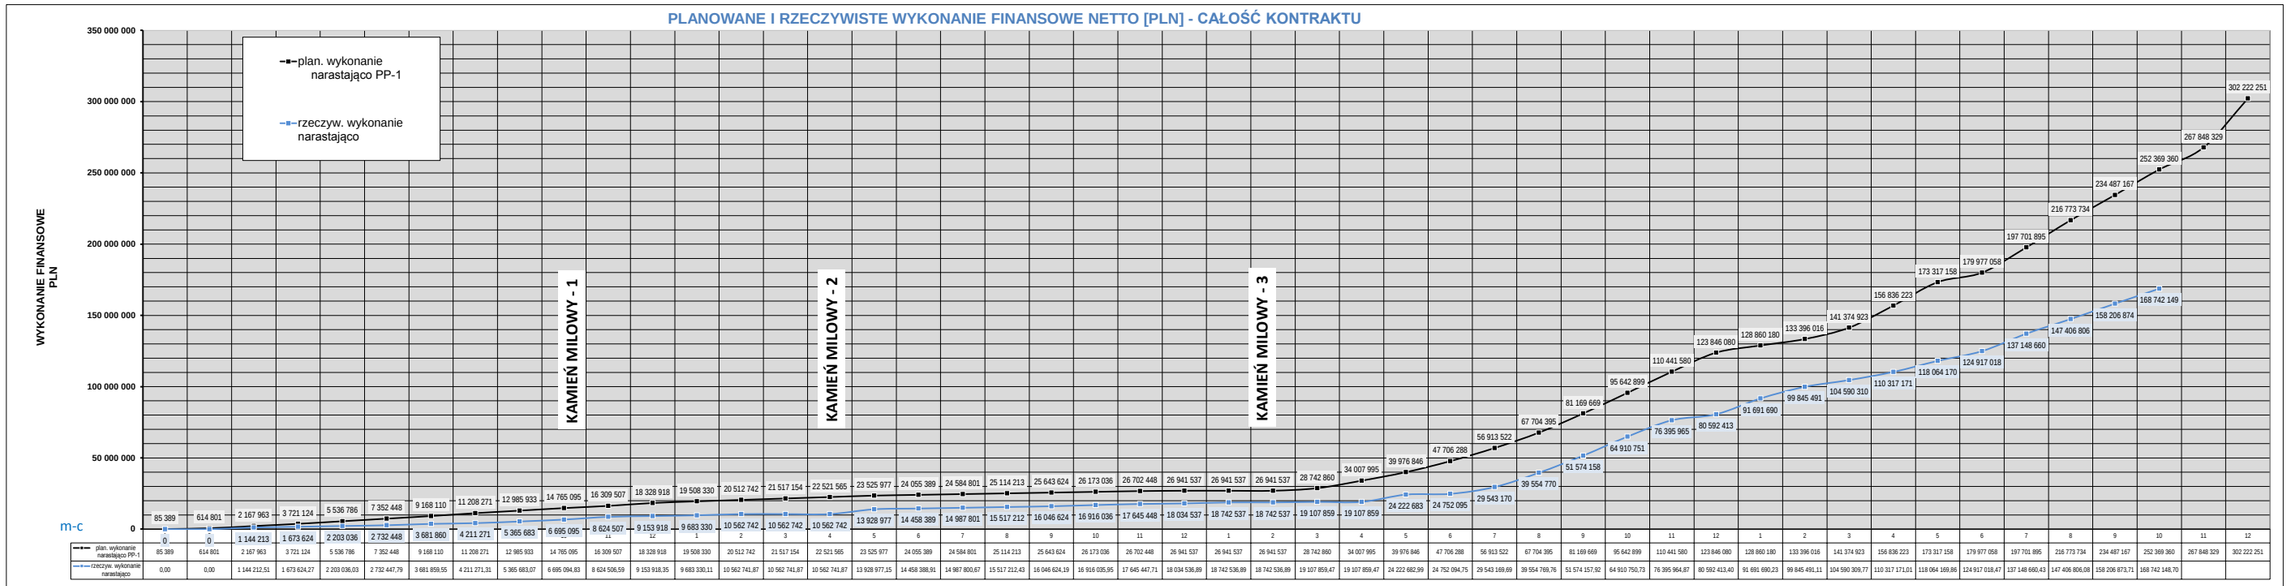

KWOTY NETTO	2016												2017												2018												2019											
Wykonanie w m-cu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Realizacja płatności	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
plan. wykonanie miesięcznie PP-1	85 389	529 412	1 553 162	1 553 162	1 815 662	1 815 662	1 815 662	2 040 162	1 777 662	1 779 162	1 544 412	2 019 412	1 179 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	1 004 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	529 412	239 089	0	0	1 801 323	5 265 136	5 968 851	7 729 442	9 207 234	10 790 873	13 465 273	14 473 231	14 796 681	13 454 500	5 014 101	4 535 835	7 978 907	15 461 300	16 480 936	6 659 899	17 724 837	19 071 840	17 713 433	17 882 192	15 478 969	34 373 923
plan. wykonanie narastająco PP-1	85 389	614 801	2 167 963	3 721 124	5 536 786	7 352 448	9 168 110	11 208 271	12 985 933	14 765 095	16 309 507	18 328 918	19 508 330	20 512 742	21 517 154	22 521 565	23 525 977	24 055 389	24 584 801	25 114 213	25 643 624	26 173 036	26 702 448	26 941 537	26 941 537	28 742 860	34 007 995	39 976 846	47 706 288	56 913 522	67 704 395	81 169 669	95 642 899	110 441 580	123 846 080	128 860 180	133 396 016	141 374 923	156 836 223	173 317 158	179 977 058	197 701 895	216 773 734	234 487 167	252 369 360	267 848 329	302 222 251
rzeczyw. wykonanie miesięcznie	0,00	0,00	1 144 212,51	529 411,76	529 411,76	529 411,76	949 411,76	529 411,76	1 154 411,76	1 329 411,76	1 929 411,76	529 411,76	529 411,76	879 411,76	0,00	0,00	3 366 235,28	529 411,76	529 411,76	529 411,76	529 411,76	869 411,76	729 411,76	389 089,18	708 000,00	0,00	365 322,58	0,00	5 114 823,52	529 411,76	4 791 074,94	10 011 600,07	12 019 388,16	13 336 592,81	11 485 214,14	4 196 448,53	11 099 276,83	8 153 800,89	4 744 818,66	5 726 861,24	7 746 998,85	6 852 848,61	12 231 641,96	10 258 145,65	10 800 067,63	10 535 274,99		
rzeczyw. wykonanie narastająco	0,00	0,00	1 144 212,51	1 673 624,27	2 203 036,03	2 732 447,79	3 681 859,55	4 211 271,31	5 365 683,07	6 695 094,83	8 624 506,59	9 153 918,35	9 683 330,11	10 562 741,87	10 562 741,87	10 562 741,87	13 928 977,15	14 458 388,91	14 987 800,67	15 517 212,43	16 046 624,19	16 916 035,95	17 645 447,71	18 034 536,89	18 742 536,89	18 742 536,89	19 107 859,47	19 107 859,47	24 222 682,99	24 752 094,75	29 543 169,69	39 554 769,76	51 574 157,92	64 910 750,73	76 395 964,87	80 592 413,40	91 691 690,23	99 845 491,11	104 590 309,77	110 317 171,01	118 064 169,86	124 917 018,47	137 148 660,43	147 406 806,08	158 206 873,71	168 742 148,70		
% zaawansowania kontraktu	0,00%	0,00%	0,38%	0,56%	0,73%	0,91%	1,22%	1,40%	1,78%	2,22%	2,86%	3,04%	3,21%	3,51%	3,51%	3,51%	4,62%	4,80%	4,98%	5,15%	5,33%	5,62%	5,86%	5,99%	6,22%	6,22%	6,34%	6,34%	8,04%	8,22%	9,81%	13,13%	17,12%	21,55%	25,36%	26,76%	30,44%	33,15%	34,72%	36,63%	39,20%	41,47%	45,53%	48,94%	52,52%	55,83%		
% wykonania harm.w okresie rozlicz.	0,00%	0,00%	73,67%	34,09%	29,16%	29,16%	52,29%	25,95%	64,94%	74,72%	124,93%	26,22%	44,89%	87,55%	0,00%	0,00%	335,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	164,22%	137,78%	162,74%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
% wykonania harm. narastająco	**0,00%**	**0,00%**	**52,78%**	**44,98%**	**39,79%**	**37,16%**	**40,16%**	**37,57%**	**41,32%**	**45,34%**	**52,88%**	**49,94%**	**49,64%**	**51,49%**	**49,09%**	**46,90%**	**59,21%**	**60,10%**	60,96%	61,79%	62,58%	64,63%	66,08%	66,94%	69,57%	69,57%	66,48%	56,19%	60,59%	51,88%	51,91%	58,42%	63,54%	67,87%	69,17%	65,07%	71,16%	74,85%	73,98%	70,34%	68,12%	69,41%	69,37%	68,00%	67,47%	66,86%		
											KM-1						***KM-2***										***KM-3***																					
